


**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4,  
INVESTIMENTO 3.4, INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI  
RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA. FINANZIATO DALL'UNIONE  
EUROPEA - NEXT GENERATION EU.**




**intellera**  
consulting

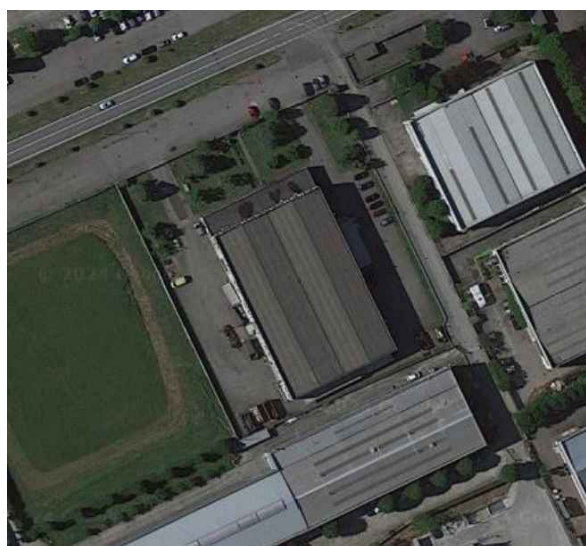

## PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA

SITO ORFANO MI150.0001 - AREA EX SIECAM  
Cronoprogramma bonifica

Progetto	Fase	Edificio/Area	Categoria	Sottocategoria	Blocco	Piano	Ambito	Tipologia	Progressivo	Revisione
E03423	POB	A06	GEN	-	-	PCP	PR	CR	00001	01
Cup G91J21000130006		Redatto Intellera Consulting		Controllato Dario Biavati		Approvato Leonardo Malagò		Scala -		Data 29/04/2024

 Via Taramelli 26 - 20124 Milano	IL DIRETTORE GENERALE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Ing. Lorenzo Gubian	Ing. Rosario Luca Cirrelli
REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA (Intellera - SGI Ingegneria)		
Intellera Consulting S.r.l. (Task Force Ambiente) Paolo Pasquini Donata Balzarolo		SGI Ingegneria S.r.l. Leonardo Malagò, Dario Biavati Lara Aleotti, Giulia Maurillo

Rev.00	29 01 2024	Emissione
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

COMUNE DI MORIMONDO (MI) - AREA EX SIECAM

VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITÀ	Settimane	1a settimana					2a÷5a settimana	6a settimana					7a settimana					8a settimana					9a settimana					10a settimana					11a settimana					12a settimana						
DESCRIZIONE	Giorni	1	2	3	4	5	6÷25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	42	43	44	45	46	42	43	44	45	46	42	43	44	45		
Predisposizione Piano di Lavoro per la bonifica amianto	5+ (4 settimane)																																											
Accantieramento e rimozione pavimentazione (hot spot C6 e C8)	3																																											
Scavo hot spot e deposito in area dedicata per analisi di classificazione	5																																											
Campionamento ed analisi chimiche di classificazione rifiuti	2 + (15)																																											
Campionamento ed analisi chimiche di collaudo hot spot	2 + (15)																																											
Smaltimento rifiuti da scavo hot spot	3																																											
Realizzazione capping hot spot C8	2																																											
Rinterro scavi, ripristino pozzo perdente e pavimentazione (hot spot C6 e C8)	7																																											
Pulizia dell'area e smobilizzo cantiere	2																																											

esecuzione attività

attesa esiti analisi di laboratorio

approvazione Piano di Lavoro
